

**VERMILION
E N E R G Y**



Vermilion Energy Netherlands

SLD-01 Water Injectie

Jaarrapportage 2019

Versie 1

10 februari 2020

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Vergunning	3
Samenvatting	4
Afwijkingen in injectiedrukken	5
Afwijkingen in annulaire drukken	6
Mechanische zaken en onderhoud	7
Incidenten of lekkages	8
Vloeistof analyses	9

Vergunning

Vermilion heeft op 15 juni 2015 op grond van de Wabo een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor de activiteiten bouwen en revisie. De aanvraag betreft inrichting Slootdorp-1. Op 19 februari 2016 heeft de Minister van Economische Zaken besloten de omgevingsvergunning te verlenen onder kenmerk DGETM-EO/16020926.

In de voorschriften behorende bij deze beschikking is opgenomen dat de meet en registratie verplichtingen jaarlijks worden geëvalueerd en in de vorm van een jaarrapportage worden ingediend. Dit rapport is een samenvatting van de activiteiten in kalenderjaar 2019.


Samenvatting

Gedurende het jaar 2019 is er geen water geïnjecteerd in put SLD-01.

Afwijkingen in annulaire drukken

De annulaire druk wordt regelmatig genoteerd tijdens routine rondes. Alle waarnemingen uit 2019 zijn in Figuur 2 weergegeven.

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd in 2019.

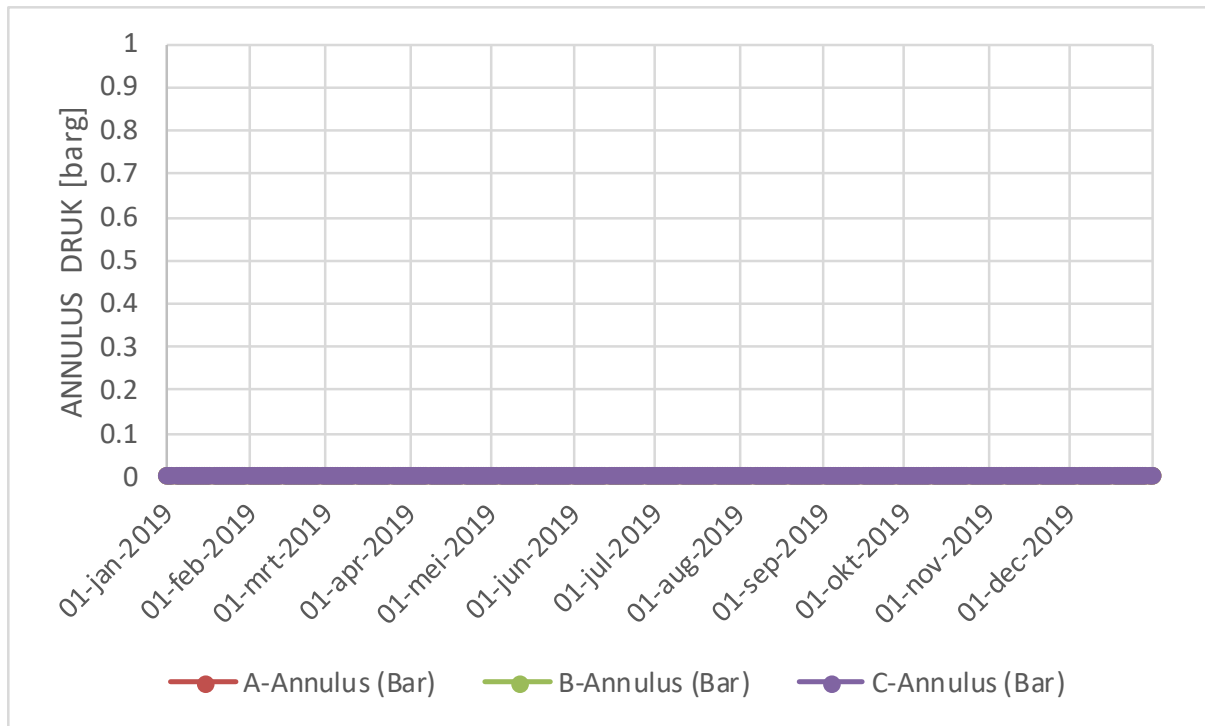

Figuur 2: SLD-01 annulus drukken in 2019.

Mechanische zaken en onderhoud

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2019:

Datum	Omschrijving
15/Jan/2019	SLD-01 wingvalve verwijderd en afgekoppeld van de flowline aangezien er geen water injectie is. Put ingesloten op master valves.
23/Apr/2019	ESD actuator afgekoppeld aangezien er geen water injectie is.

Incidenten of lekkages

Er hebben zich in 2019 geen incidenten of lekkages voor gedaan.

Vloeistof analyses

Er is geen water geïnjecteerd in 2019 in SLD-01. Er is dus geen vloeistof analyse gedaan van geïnjecteerd water.
